



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN.

INSTANCIA RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHIATIPAN, HIDALGO.

1. SIENDO LAS 11:00 HORAS, DEL DIA 18 DEL MES DE agosto DEL AÑO 2022, SE REUNIERON LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, BENEFICIARIOS Y/O LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO, LA OBRA Y/O ACCIÓN, CON LA FINALIDAD DE CONSTATAR LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y/O EN SU CASO LA OPERACIÓN DE LAS MISMAS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS O MODIFICADAS AUTORIZADAS.

2- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN:

RAMO: 33 EJERCICIO: 2022 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 PROGRAMA: S31 - ELECTRIFICACION
 SUBPROGRAMA: 20 - ZONA RURAL
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC. PACHIQUITLA
 NORMATIVA: GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO
 NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC. PACHIQUITLA
 CLAVE DE OBRA Y/O ACCION: 2022/FAISM078035
 NO. DE BENEFICIARIOS: 137 HAB.

3.- LOCALIZACIÓN:


MUNICIPIO: XOCHIATIPAN
 LOCALIDAD: PACHIQUITLA
 LATITUD: 20.844645 LONGITUD: -98.336689



4.- AUTORIZACIÓN DE RECURSOS:

OFICIO DE AUTORIZACIÓN NO.: SEFINP-V-FAISM/GI-2022-078-010 FECHA: 16/05/2022
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: _____ FECHA: _____
 OFICIO DE MODIFICACIÓN NO.: _____ FECHA: _____

INVERSIÓN:	APROBADA	EJERCIDA
TOTAL=	\$ <u>950,000.00</u>	\$ <u>950,000.00</u>
FEDERAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
ESTATAL=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
MUNICIPAL=	\$ <u>950,000.00</u>	\$ <u>950,000.00</u>
BENEFICIARIOS=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>
SALDO=	\$ <u>0.00</u>	\$ <u>0.00</u>

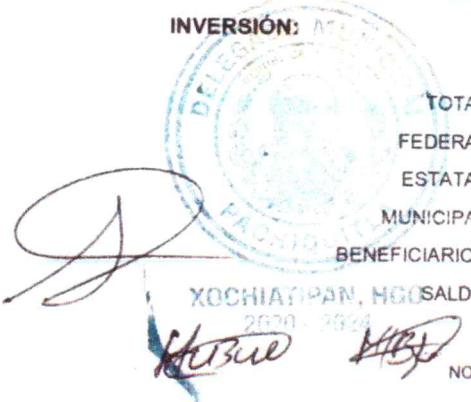

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOC. PACHIQUITLA
CLAVE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN: 2022/FAISM078035

5.- METAS APROBADAS Y/O MODIFICADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRANSF DC1-15-33000YT/19050-120/240 TIPO POSTE CON VOLTAJE DE OPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE, MANIOBRA CON GRÚA HIAB CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
POSTES Y RETENIDAS		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12.00 M. DE ALTURA PCR-12-750, INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPAS DE 1.8 X 0.5 M. DE DIAM. PARA EL SEMBRADO DEL POSTE) RETIROS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACIÓN MANO DE OBRA, GRÚA HIAB, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LÍNEA BIFÁSICA TIPO ANCLAJE DOBLE AD2N EN MEDIA TENSIÓN PARA VOLTAJE EN 33 KV., INCLUYE: CRUCETAS, ABRAZADERAS, AISLADORES PARA MEDIA TENSIÓN, BASTIDORES, MATERIAL, MANO DE OBRA, GRÚA HIAB, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LÍNEA BIFÁSICA DE PASO TIPO TS2N PARA MEDIA TENSIÓN PARA VOLTAJE EN 33 KV., INCLUYE: CRUCETAS, ABRAZADERAS, AISLADORES, BASTIDORES, MANO DE OBRA, EQUIPO HABILITADO CON GRÚA TIPO HIAB Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LÍNEA BIFÁSICA TIPO DOBLE REMATE RD2N/RD2 PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN PARA VOLTAJE EN 33 KV., INCLUYE: CRUCETAS ABRAZADERAS, AISLADORES PARA MEDIA TENSIÓN, BASTIDORES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LÍNEA BIFÁSICA TIPO REMATE RD2N EN MEDIA TENSIÓN PARA VOLTAJE EN 33 KV., INCLUYE: CRUCETAS, ABRAZADERAS, AISLADORES PARA MEDIA TENSIÓN, BASTIDORES, MANO DE OBRA, GRÚA HIAB, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PARA ENTRONQUES DE MEDIA TENSIÓN EN LÍNEA BIFÁSICA RD2N/CCF, PARA VOLTAJE EN 33 KV, INCLUYE: HERRAJES, (2) CORTACIRCUITOS FUS. CCF 38-100-200-500, CRUCETAS, AISLADORES, ABRAZADERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUS. CCF 38-100-200-500 CON NORMA Y PROTOCOLOS PARA C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYO T. DIST. ADOM 27 KV. OXIDO DE ZINC CON NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO 1P3 PARA BAJA TENSIÓN, INCLUYE: HERRAJES, BASTIDORES CON AISLADORES ABRAZADERAS, FLEJE, MANO DE OBRA, GRUA HIAB, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO REMATE PARA BAJA TENSIÓN 1R3, INCLUYE: HERRAJES, BASTIDORES CON AISLADORES ABRAZADERAS, FLEJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO DOBLE REMATE PARA BAJA TENSIÓN 1R3/1R3, INCLUYE: HERRAJES, BASTIDORES CON AISLADORES, ABRAZADERAS, FLEJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO BANQUETA RBA PARA LÍNEA DE MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN. INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.6 X 0.5 M. PARA ANCLAR PERNO ANCLA, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CABLE AG 3/8", MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ARMADO DE RETENIDA DOBLE, INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPAS DE 1.50 X 0.5 M. DE DIAM. PARA EL SEMBRADO DEL PERNO ANCLA) RETIROS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CABLE PARA RETENIDA, AISLADOR 4R, GUARDACABO G2, REMATE PREFORMADO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR A BASE DE ELECTRODO PARA TIERRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HABILITADO CON GRÚA TIPO HIAB Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA REMATES DE BAJA Y REMATES DE NEUTRO A BASE DE ELECTRODO PARA TIERRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HABILITADO CON GRÚA TIPO HIAB Y HERRAMIENTA	PZA	2.00

NUMERACIÓN DE ESTRUCTURAS CON NÚMEROS NEGROS DE 10 CM. Y FONDO AMARILLO, INCLUYE: SUMINISTRO DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	8.00
RETIRO DE POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA DE 9.00 A 12.00 M. DE ALTURA PARA LÍNEA DE MEDIA O BAJA TENSIÓN CON GRÚA HIAB, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA RETIRO DE POSTE, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TRASLADO DEL MISMO DEL PUNTO EN GRÚA TIPO HIAB AL ALMACÉN MAS CERCAÑO DE C.F.E. EN LA ZONA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3.00
RETIRO DE HERRAJES, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN POSTES DE 9.00 A 12. M., INCLUYE: RETIRO DE AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
RETIRO DE LÍNEA DE MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN DE CABLE MÚLTIPLE Y/O ACSR EXISTENTE DE C.F.E., INCLUYE: CORTE DE CONDUCTOR, ENROLLE DE CABLEADO, RETIRO Y ENTREGA/TRASLADO A ALMACÉN EXISTENTE DE C.F.E. MAS CERCAÑO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	155.00
CONEXIÓN A LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE CON LIBRANZA EN CIRCUITO POR PARTE DE PERSONAL DE C.F.E., INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ACOMETIDAS AÉREAS, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 AMP, EXCAVACIÓN (CEPAS DE 1.60 X 0.5 M. DE DIAM. PARA EL SEMBRADO DEL MURETE), COMPACTACIÓN, RETIROS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TUBO Y MUFA PARA ACOMETIDA, BASE DE MEDICIÓN, CENTRO DE CARGA QO2, COLOCACIÓN CON GRÚA HIAB, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00
SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A BASE DE CABLE TRENZADO 1+1 CAL. 6 AWG, INCLUYE: 50.00 M. DE CABLE TRENZADO, TENSIONADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	15.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA SUB-URBANA CON FOCO LED DE 36-50WATTS 120/277VCA, 60 HZ ELABORADA CON CARCASAS DE ALUMINIO REFORZADO 4600K EN COLOR DE ILUMINACIÓN BLANCO, FABRICA DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, CUMPLE CON CERTIFICACIÓN NOM-031-ENE-2012, INCLUYE: BRAZO DE 100 MM., CABLE CAL #12, FOTOCELDA FLEJE METÁLICO, MANO DE OBRA, EQUIPO HABILITADO CON GRÚA TIPO HIAB Y HERRAMIENTA	PZA	10.00
LÍNEA DE MEDIA Y BAJA TENSION		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PARA MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	59.3856
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA EN BAJA TENSIÓN CON CABLE MÚLTIPLE ALUMINIO CABLE MÚLTIPLE ALUMINIO (2+1) 1/0-2C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	194.0218
MAMPARA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERÁ DE 54 x 62 cm. EL FONDO SERÁ EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO. LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

6.- METAS EJECUTADAS (Indicar: Conceptos y Cantidades):

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO TRANSF DC1-15-33000YT/19050-120/240 TIPO POSTE CON VOLTAJE DE OPERACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, MONTAJE, MANIOBRA CON GRÚA HIAB CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
POSTES Y RETENIDAS		

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12.00 M. DE ALTURA PCR-12-750, INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPAS DE 1.8 X 0.5 M. DE DIAM. PARA EL SEMBRADO DEL POSTE) RETIROS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PIEDRA BOLA PARA COMPACTACIÓN MANO DE OBRA, GRÚA HIAB, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LÍNEA BIFÁSICA TIPO ANCLAJE DOBLE AD2N EN MEDIA TENSIÓN PARA VOLTAJE EN 33 KV., INCLUYE: CRUCETAS, ABRAZADERAS, AISLADORES PARA MEDIA TENSIÓN, BASTIDORES, MATERIAL, MANO DE OBRA, GRÚA HIAB, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LÍNEA BIFÁSICA DE PASO TIPO TS2N PARA MEDIA TENSIÓN PARA VOLTAJE EN 33 KV., INCLUYE: CRUCETAS, ABRAZADERAS, AISLADORES, BASTIDORES, MANO DE OBRA, EQUIPO HABILITADO CON GRÚA TIPO HIAB Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LÍNEA BIFÁSICA TIPO DOBLE REMATE RD2N/RD2 PARA CAMBIOS DE DIRECCIÓN PARA VOLTAJE EN 33 KV., INCLUYE: CRUCETAS ABRAZADERAS, AISLADORES PARA MEDIA TENSIÓN, BASTIDORES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA LÍNEA BIFÁSICA TIPO REMATE RD2N EN MEDIA TENSIÓN PARA VOLTAJE EN 33 KV., INCLUYE: CRUCETAS, ABRAZADERAS, AISLADORES PARA MEDIA TENSIÓN, BASTIDORES, MANO DE OBRA, GRÚA HIAB, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ARMADO DE ESTRUCTURA PARA ENTRONQUES DE MEDIA TENSIÓN EN LÍNEA BIFÁSICA RD2N/CCF, PARA VOLTAJE EN 33 KV, INCLUYE: HERRAJES, (2) CORTACIRCUITOS FUS. CCF 38-100-200-500. CRUCETAS, AISLADORES, ABRAZADERAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUS. CCF 38 100 200 500 CON NORMA Y PROTOCOLOS PARA C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYO T. DIST. ADOM 27 KV. OXIDO DE ZINC CON NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO IP3 PARA BAJA TENSIÓN, INCLUYE: HERRAJES, BASTIDORES CON AISLADORES ABRAZADERAS, FLEJE, MANO DE OBRA, GRÚA HIAB, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO REMATE PARA BAJA TENSIÓN 1R3, INCLUYE: HERRAJES, BASTIDORES CON AISLADORES ABRAZADERAS, FLEJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO DOBLE REMATE PARA BAJA TENSIÓN 1R3/1R3, INCLUYE: HERRAJES, BASTIDORES CON AISLADORES, ABRAZADERAS, FLEJE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RETENIDA TIPO BANQUETA RBA PARA LÍNEA DE MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN, INCLUYE: EXCAVACIÓN DE 1.6 X 0.5 M. PARA ANCLAR PERNO ANCLA, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CABLE AG 3/8", MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ARMADO DE RETENIDA DOBLE, INCLUYE: EXCAVACIONES (CEPAS DE 1.50 X 0.5 M. DE DIAM. PARA EL SEMBRADO DEL PERNO ANCLA) RETIROS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CABLE PARA RETENIDA, AISLADOR 4R, GUARDACABO G2, REMATE PREFORMADO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR A BASE DE ELECTRODO PARA TIERRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HABILITADO CON GRÚA TIPO HIAB Y HERRAMIENTA	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA REMATES DE BAJA Y REMATES DE NEUTRO A BASE DE ELECTRODO PARA TIERRAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO HABILITADO CON GRÚA TIPO HIAB Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
NUMERACIÓN DE ESTRUCTURAS CON NÚMEROS NEGROS DE 10 CM. Y FONDO AMARILLO, INCLUYE: SUMINISTRO DE PINTURA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	8.00
RETIRO DE POSTE DE CONCRETO Y/O MADERA DE 9.00 A 12.00 M. DE ALTURA PARA LÍNEA DE MEDIA O BAJA TENSIÓN CON GRÚA HIAB, INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA RETIRO DE POSTE, RETIRO DE MATERIALES PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN, TRASLADO DEL MISMO DEL PUNTO EN GRÚA TIPO HIAB AL ALMACÉN MAS CERCANO DE C.F.E. EN LA ZONA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3.00
RETIRO DE HERRAJES, DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN POSTES DE 9.00 A 12. M., INCLUYE: RETIRO DE AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	4.00
RETIRO DE LÍNEA DE MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN DE CABLE MÚLTIPLE Y/O ACSR EXISTENTE DE C.F.E., INCLUYE: CORTE DE CONDUCTOR, ENROLLE DE CABLEADO, RETIRO Y ENTREGA/TRASLADO A ALMACÉN EXISTENTE DE C.F.E. MAS CERCANO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	155.00

CONEXIÓN A LA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE CON LIBRANZA EN CIRCUITO POR PARTE DE PERSONAL DE C.F.E., INCLUYE: HERRAJES, EQUIPO DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN	PZA	1.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ACOMETIDAS AÉREAS, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 AMP, EXCAVACIÓN (CEPAS DE 1.60 X 0.5 M. DE DIAM. PARA EL SEMBRADO DEL MURETE), COMPACTACIÓN, RETIROS DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TUBO Y MUFA PARA ACOMETIDA, BASE DE MEDICIÓN, CENTRO DE CARGA QO2, COLOCACIÓN CON GRÚA HIAB, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	15.00
SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA A BASE DE CABLE TRENZADO 1+1 CAL. 6 AWG, INCLUYE: 50.00 M. DE CABLE TRENZADO, TENSIONADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	15.00
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA SUB-URBANA CON FOCO LED DE 36-50WATTS 120/277VCA, 60 HZ ELABORADA CON CARCASAS DE ALUMINIO REFORZADO 4600K EN COLOR DE ILUMINACIÓN BLANCO, FABRICA DE INYECCIÓN DE ALUMINIO, CUMPLE CON CERTIFICACIÓN NOM-031-ENE-2012, INCLUYE: BRAZO DE 100 MM., CABLE CAL. #12, FOTOCELDA FLEJE METÁLICO, MANO DE OBRA, EQUIPO HABILITADO CON GRÚA TIPO HIAB Y HERRAMIENTA	PZA	10.00
LÍNEA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN		
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE EXTENSIÓN DE LÍNEA PARA MEDIA TENSIÓN CON CABLE ACSR 1/0, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	KG	59.3856
SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA EN BAJA TENSIÓN CON CABLE MÚLTIPLE ALUMINIO CABLE MÚLTIPLE ALUMINIO (2+1) 1/0-2C, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M	194.0218
MAMPARA		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/8", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1 1/2" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00

7.- MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

ADMINISTRACIÓN: DIRECTA () COMITÉ () CONTRATO (X) CONVENIO ()
 ADJUDICACIÓN: ADJ. DIRECTA (X) INV. RESTRINGIDA () LICITACION PUBLICA ()

EJECUTORA: **ARIEL SAENZ HERNANDEZ**

Nº. DE CONTRATO: **MXO-FAISM-2022-A.D.-042** FECHA: **19/05/2022** IMPORTE: **\$ 950.000.00**

Nº. DE CONVENIO: ----- FECHA: ----- IMPORTE: \$ -----

FECHA DE INICIO PROGRAMADA: **20/05/2022** FECHA DE INICIO REAL: **20/05/2022**

FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA: **17/08/2022** FECHA DE TERMINACIÓN REAL: **07/08/2022**

PRORROGAS: ----- FECHA DE CIERRE DE BITACORA: **07/08/2022**

8.- ACTO DE ENTREGA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, PROYECTO O ACCIÓN, MEDIANTE REVISIÓN, INSPECCIÓN Y/O RECORRIDO, POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, OBRA O ACCIÓN, SE ENCUENTRA **TOTALMENTE** TERMINADA DE ACUERDO CON LA AUTORIZACIÓN DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, ASÍ COMO SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA A ENTERA SATISFACCION DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

ASI MISMO, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA RESPONSABLE, CONTRATISTAS Y/O PROVEEDORES, DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y/O DEFICIENCIAS QUE RESULTEN, INCLUYENDO LAS AFECTACIONES QUE SE DERIVEN POR TALES, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN, Y EN ESTE ACTO, SE OBLIGAN POR LA PRESENTE A CORREGIR LOS MISMOS SIN COSTO ALGUNO PARA EL ERARIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, EN TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO.

DE IGUAL FORMA, SE HACE CONSTAR QUE LA SUSCRIPCION DE LA MISMA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE HIDALGO, DE NINGUNA FORMA EXIME A LAS PERSONAS REFERIDAS EN EL PARRAFO ANTERIOR, DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN CUALQUIER MOMENTO PUEDAN SER DETERMINADAS POR INSTANCIAS DE FISCALIZACION Y CONTROL COMPETENTES; EN TERMINOS DE LOS QUE DISPONEN LOS ARTICULOS 93 Y 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO Y/O SUS CORRELATIVOS EN LA LEGISLACION FEDERAL EN CASO DE SER APLICABLE.

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A: LA LOCALIDAD, QUIEN SERÁ LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, MISMA QUE LA RECIBE CON EL MAS AMPLIO CONSENTIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, SIENDO LAS 11:55 HRS. DEL MISMO DÍA, MES Y AÑO DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN DE CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LA INTEGRAN, DE CONFORMIDAD, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

9.- PARTICIPANTES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN.

ENTREGA

GOBIERNO DEL ESTADO

DEPENDENCIA RESPONSABLE:

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE: L.A.E. OSCAR BAUTISTA GUTIÉRREZ

CARGO: PRESIDENTE MUNICIPAL

AREA DE DEPENDENCIA EJECUTORA.

NOMBRE: ARO. RODRIGO HERNANDEZ FRANCO

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATISTA O PROVEEDOR:

NOMBRE: Ariel Saenz Hdez

CARGO: Contratista

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA.

RECIBE

CHICHAUQUILTA, HGO. 2020 - 2024

FOR LA ENTIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION:

FIRMA Y SELLO: [Firma]

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

NOMBRE: Antonio Hdez Hdez

CARGO: Subdirector de obras publicas

FOR LA COMUNIDAD AUTORIDAD LOCAL).

FIRMA Y SELLO: [Firma]

NOMBRE: Moses Hdez Cruz

CARGO: Delegado

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO: [Firma]

NOMBRE: Humberto Sta Maria

CARGO: presidente

RECIBE POR EL COMITÉ DE OBRA

FIRMA Y SELLO: [Firma]

[Handwritten signature]

NOMBRE: Rommel Aldair Ramirez Perez
CARGO: Supervisor de obras publicas

NOMBRE: Marcos Ota Catarina
CARGO: Secretario

[Handwritten signature]
NOMBRE: Indeo Pardiniel Redo
CARGO: Contab. Internompeal

RECIBE POR EL COMITE DE OBRA

[Handwritten signature]
NOMBRE: Andres Ramirez Hdez
CARGO: Tesorero

POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

NOMBRE: _____
CARGO: _____


[Handwritten signature]
Juan Nicolas Hdez Hdez
V.Cr.S

No. de Oficio de Comisión: _____

FECHA DE FIRMA DE ACTA: _____

A LA PRESENTE ACTA SE LE DEBERÁN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS, RELATIVOS Y/O LOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

10.- OBSERVACIONES:



[Handwritten signature]



[Large handwritten signature]
